


# 西湘バイパス 消波ブロック撤去工事 概要書

- 1) 工事名  
西湘バイパス 消波ブロック撤去工事
- 2) 発注者  
中日本高速道路株式会社 東京支社
- 3) 施工者  
東亜建設工業株式会社 横浜支店
- 4) 工事期間  
(自) 平成24年 1月27日  
(至) 平成25年 3月21日

\*数量等、変動する場合があります

工 事 内 容	施 工 数 量
消波ブロック撤去工	延長 約500m 4,545 個
捨石掘削	延長 約700m 25,000 m <sup>3</sup>
消波ブロック沈設 (小田原魚礁造成)	前川・国府津・酒匂 南町・米神・江之浦 1,500 個
国府津IC護岸工	洗掘防止マット据付 消波ブロック据付 367 個
2号突堤補修工	構造物掘削・取壊し コンクリート打設 1 式


5) 工事概要  
本工事は、平成19年9月に発生した台風9号により被災した西湘バイパス西湘二宮IC付近の災害復旧工事で使用した仮設消波ブロックの撤去を行う工事です。撤去した消波ブロックを国府津IC付近の海岸へ設置し橋脚の防護を図ります。その他撤去した消波ブロックは、小田原魚礁造成部へ沈設する等有効利用を図ります。

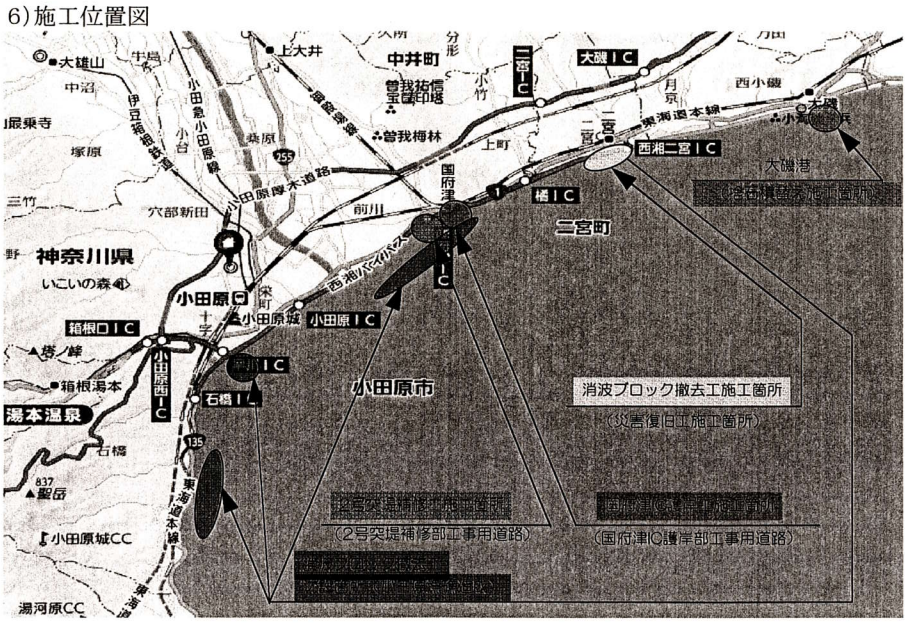

7) 計画工程表

\*時期、内容等、変動する場合があります

月 日	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
消波ブロック撤去工	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
捨石掘削														
消波ブロック沈設														
国府津IC護岸工														
2号突堤補修工														

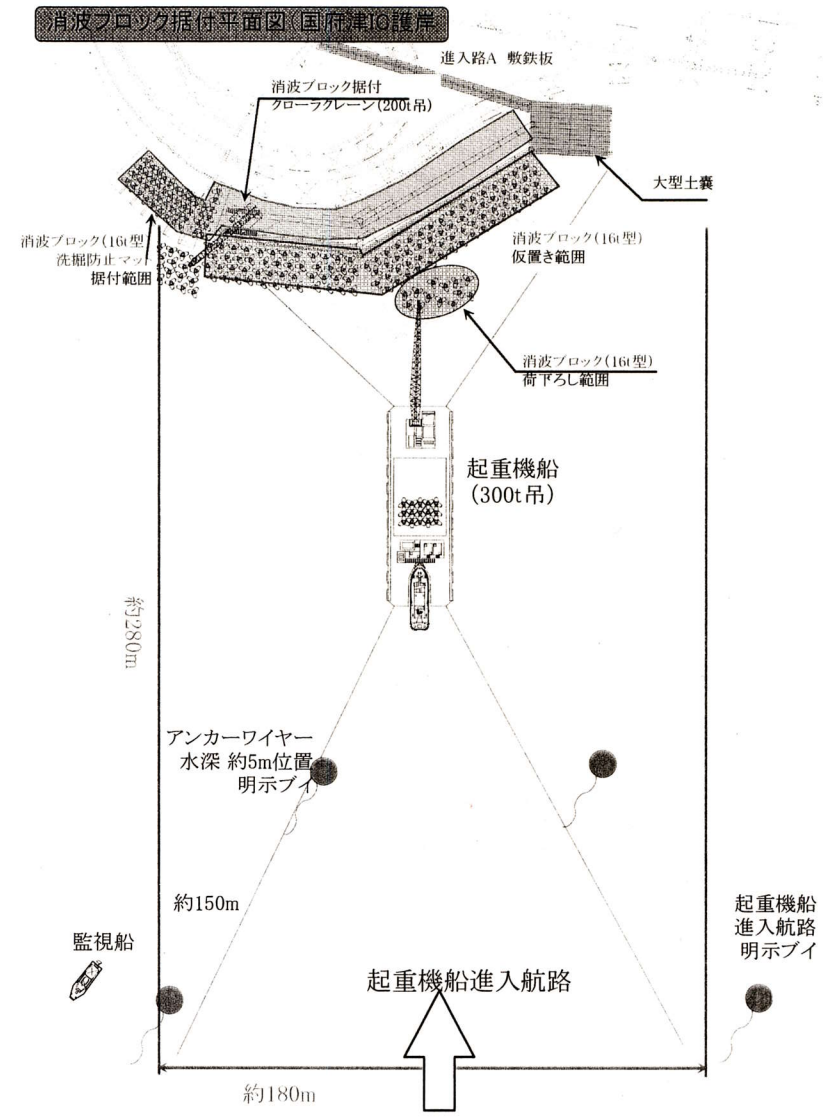

※消波ブロック撤去及び据付作業の際は、監視船を配置して行います。  
 ※作業中の騒音には十分に留意します。

連絡先: 東亜建設工業株式会社 小田原作業所 電話0465-24-5583

